

Паспорт проекта

«Создание электронной базы данных по обеспечению ДОУ игровым оборудованием»

Общая информация



Наименование органа местного самоуправления: Управление образования администрации Старооскольского городского округа.

Наименование отдела : МБДОУ ДС №61 «Семицветик» г. Старый Оскол Белгородской области.

Границы процесса: От формирования заявки поставщику до размещения игрового оборудования по кабинетам ДОУ.

Дата начала проекта: 15.07.2020

Дата окончания проекта: 18.11.2020

Обоснование выбора процесса

1. Отсутствие постоянного перечня заказываемого игрового оборудования.
2. Временные затраты на сбор и поиск информации, 1200 -2400 мин.
3. Временные затраты на выбор и износ предлагаемого списка, 960-1440 мин.
4. Необходимость постоянной актуализации информации.
5. Временные затраты на мониторинг износа оборудования, 1200-1440 мин.
6. Излишние затраты на закупку не актуального или дублирующего оборудования, 1500 – 3000 руб.
7. Нарушение сроков предоставления заявки, 2400 мин.
8. Отсутствие системы в работе с поставщиками.
9. Удовлетворенность участников образовательных отношений пополнением игрового оборудования в ДОУ, 69%

Цель проекта

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени протекания процесса, мин.	1800-2400	5
1.1. Сокращение времени на поиск информации, мин	1200 -2400	5
1.2. Сокращение времени на мониторинг износа оборудования, мин	1200-1440	7
1.3. Сокращение времени на поиск необходимых средств, мин	1400-1600	8
1.4. Сокращение времени на разработку электронной базы данных, мин	240	5
2. Удовлетворенность участников образовательных отношений пополнением игрового оборудования, %	69	100

Эффекты проекта

Обеспечение качественных материально-технических условий реализации ООП ДО.

Снижение материальных затрат при оптимизации процесса выбора и закупки игрового оборудования.

Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений пополнением игрового оборудования, 100 %

Команда проекта

Руководство
проектом




Заказчик проекта



**Домарева И. Н.,
заведующий**

Руководитель проекта

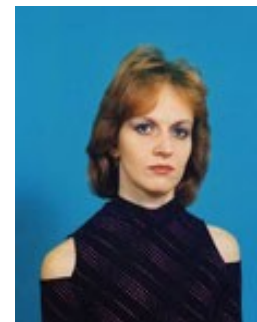

**Петровская А.В.
старший воспитатель**

Рабочая группа проекта




**Скоробогатых О.А.,
воспитатель**



**Кремова Е.В.,
воспитатель**



**Сухачева Е.Н.
воспитатель**



**Хожайнова Е.И.,
воспитатель**



**Дядяшева Г.И.,
воспитатель**



**Халеева А.В.,
воспитатель**



**Самсонова Н.В.,
инструктор по
физической
культуре**

Карта текущего состояния

«Создание электронной базы данных по обеспечению ДОУ игровым оборудованием»

22.07.2020




Условные обозначения

1	Отсутствие постоянного перечня заказываемого оборудования	Временные затраты на сбор и поиск информации
2	Отсутствие системы в работе с поставщиками	Временные затраты на мониторинг износа оборудования
3	Нарушение сроков предоставления заявки	Неудовлетворенность участников образовательных отношений актуализацией и пополнением игрового оборудования ДОУ
4	Необходимость постоянной актуализации информации	Человеческий фактор
5	Временные затраты на выбор из предполагаемого списка	Излишние затраты на закупку не актуального или дублирующего оборудования
6		
7		
8		
9		
10		

ВПП (время протекания процесса) – 1800- 2400 мин.

Пирамида проблем

«Создание электронной базы данных по обеспечению ДОУ игровым оборудованием»

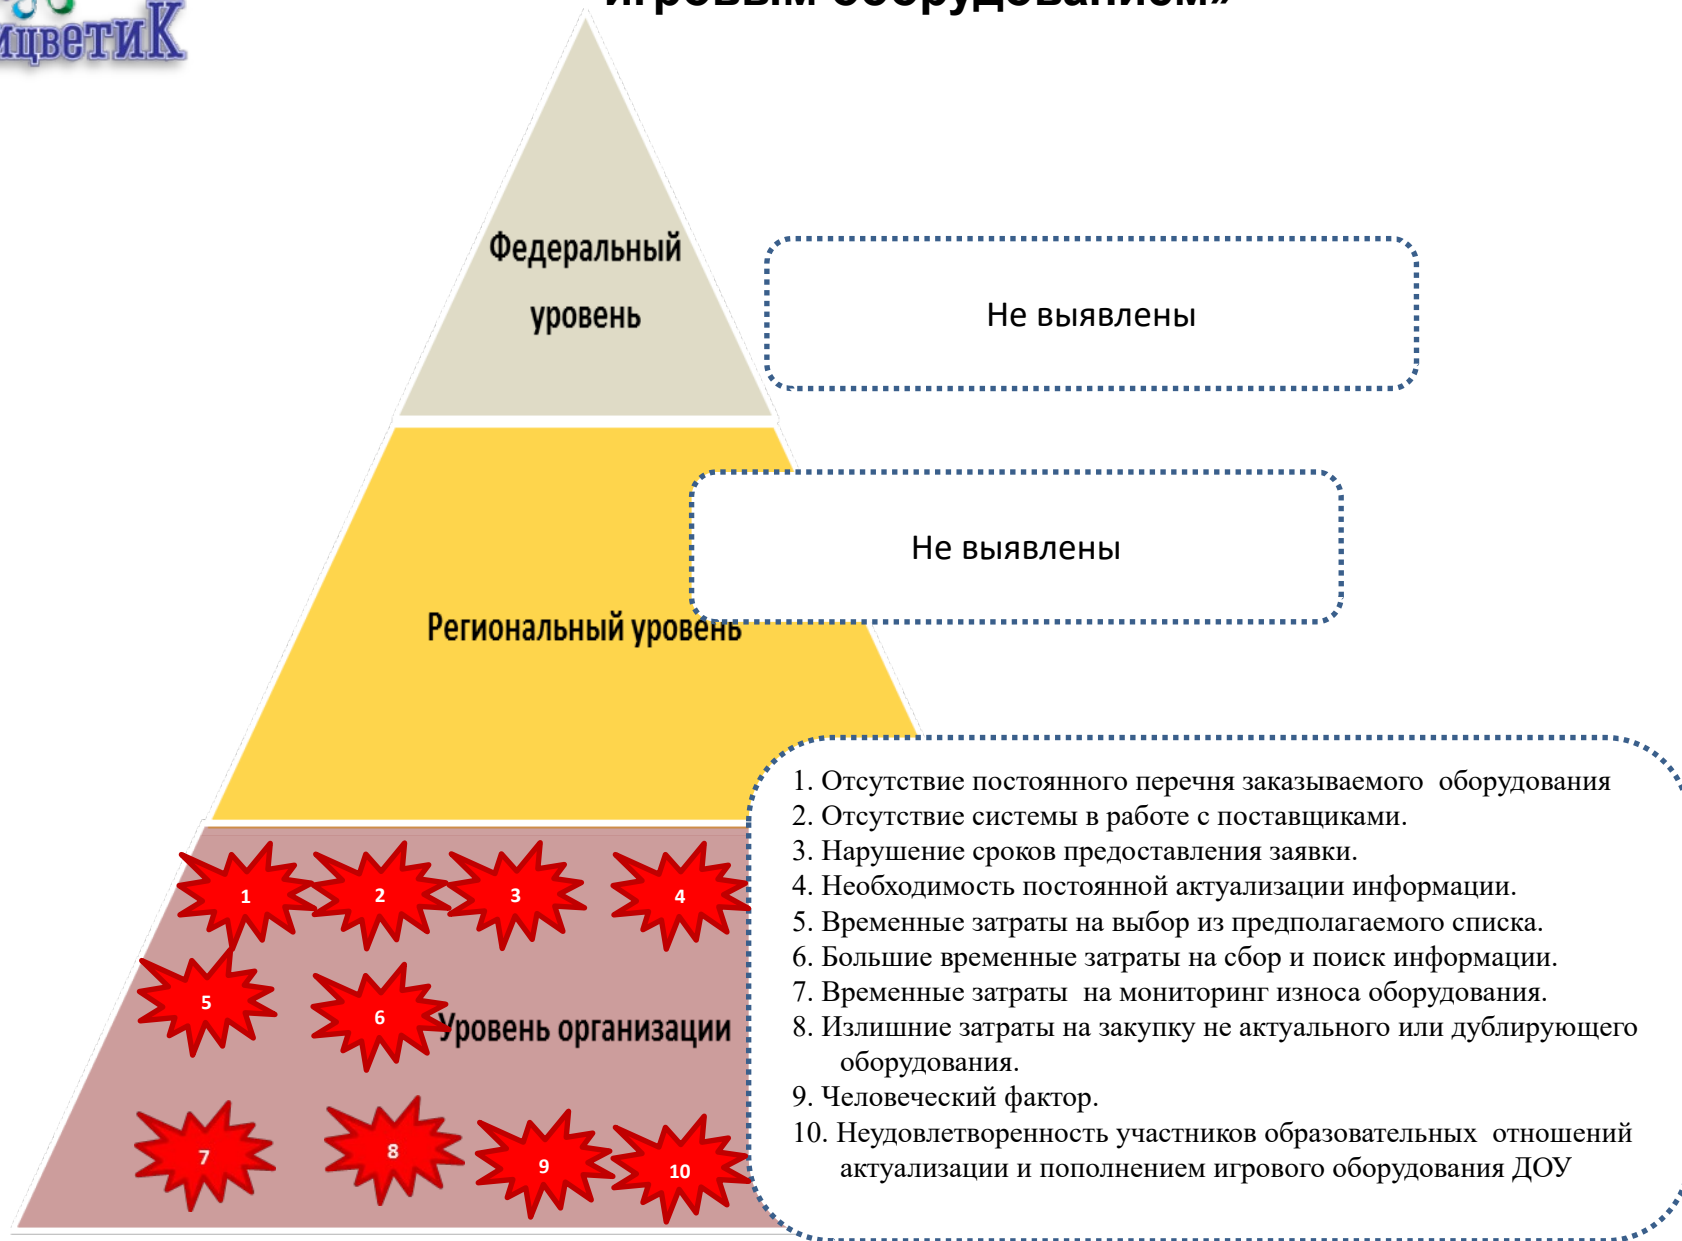


Анализ проблем

№ п/п	Проблема	Первопричина	Решение	Вклад в достижение цели, мин
1	Отсутствие постоянного перечня заказываемого оборудования	Отсутствие внутренней логистики процесса, возможности поставщиков	Создать алгоритм по составлению модифицируемого перечня заказов на основе аналитических данных мониторинга	60 мин
2	Временные затраты на сбор и поиск информации	Отсутствие внутренней логистики процесса, человеческий фактор	Создать базу данных игрового оборудования, эффективный мониторинг базы	240 мин
3	Временные затраты на выбор из предлагаемого списка		Систематизировать работу с поставщиками, мониторить список на основе требуемого оборудования	240 мин
4	Необходимость постоянной актуализации информации	Необходимость соответствия программным требованиям	Создать базу данных игрового оборудования, заполнить графы «актуализации»	240 мин
5	Временные затраты на мониторинг износа оборудования	Отсутствие внутренней логистики процесса, человеческий фактор	Создать базу данных игрового оборудования, регулярно проводить эффективный мониторинг базы	240 мин
6	Излишние затраты на закупку не актуального или дублирующего оборудования			
7	Нарушение сроков предоставления заявки	Хаотичность сбора информации		
8	Отсутствие системы в работе с поставщиками	Отсутствие внутренней логистики процесса, хаотичность предложений и закупок оборудования	Систематизировать работы с поставщиками, создать алгоритм действий	240 мин
9	Неудовлетворенность участников образовательных отношений	Длительность процедуры оформления документации по поставкам, человеческий фактор	Оптимизировать процесс обеспечения ДОУ игровым оборудованием	50 мин



Карта идеального состояния процесса «Создание электронной базы данных по обеспечению ДОУ игровым оборудованием»

03.08.2020

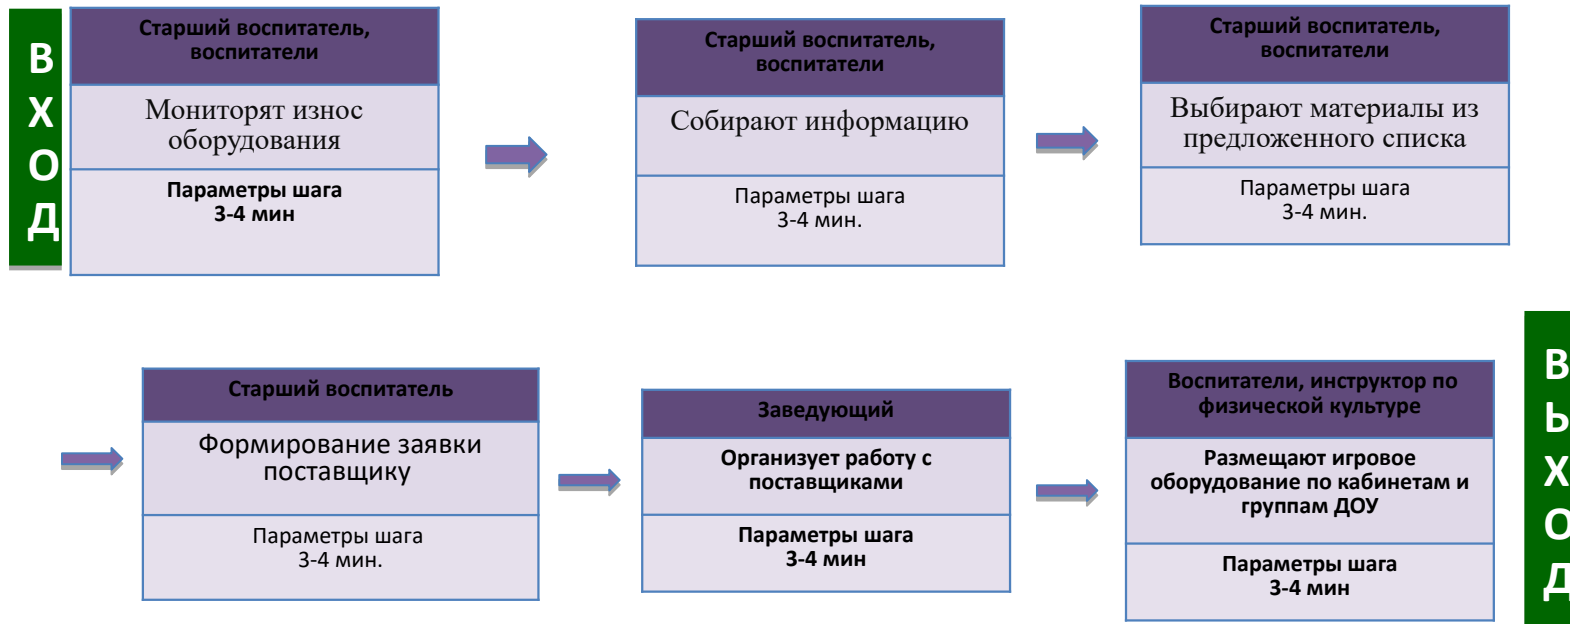


ВПП (время протекания процесса) – 15-25 мин.



Карта целевого состояния процесса «Создание электронной базы данных по обеспечению ДОУ игровым оборудованием»

27.07.2020

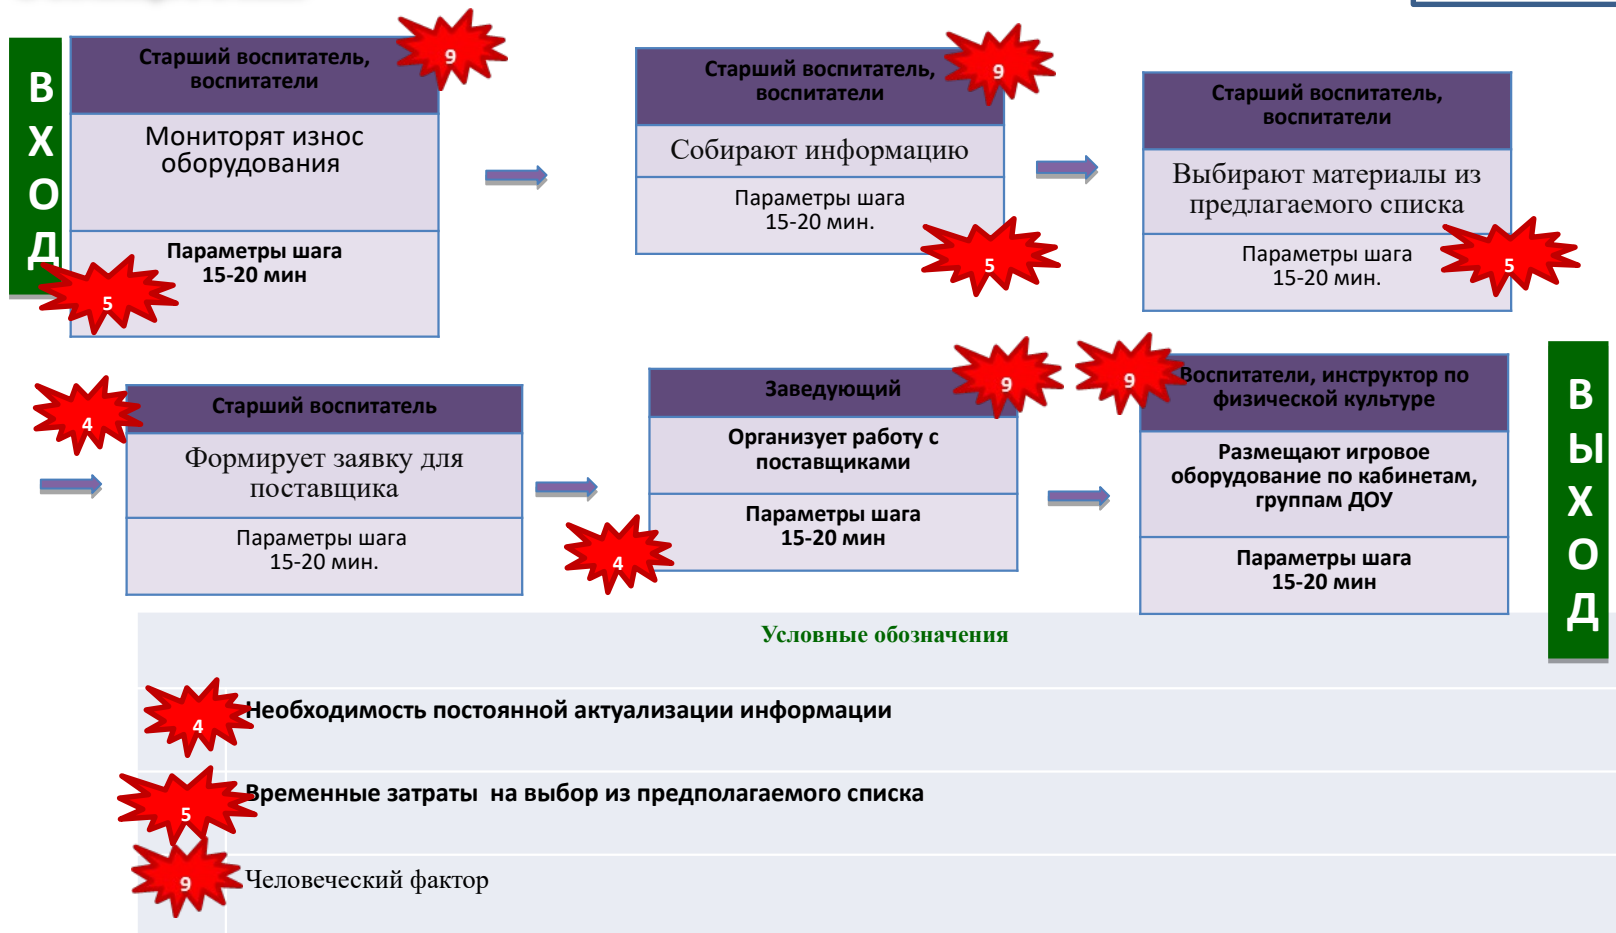

ВПП (время протекания процесса) - 90-120 мин.

Достигнутые результаты (было и стало)

Факторы успеха




Было: затраты времени на инвентаризацию

Было: временные затраты на сбор информации в электронном и бумажном виде



Стало: создана электронная база данных, оптимизирован процесс поставки игрового оборудования, систематизирована работа с поставщиками

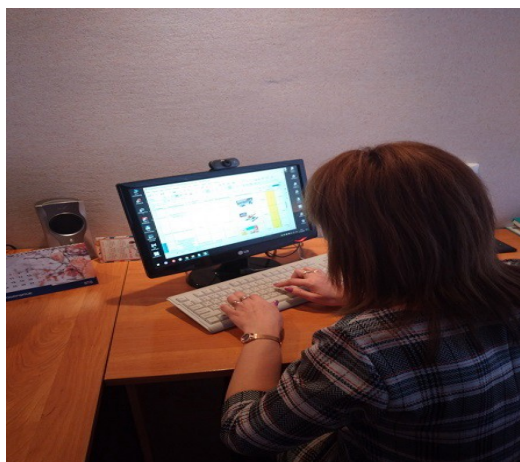

Достигнутые результаты (было и стало)

Результаты проекта

БЫЛО



Отсутствие электронной базы данных игрового оборудования в ДООУ, временные затраты



Отсутствие системы в работе с поставщиками.
Экономические потери

Потери ожидания, неудовлетворенность участников процесса


СТАЛО



Разработана электронная база данных в ДООУ: сокращены временные затраты, устранены экономические потери, возросла удовлетворенность участников процесса.

Разработана стандартная операционная процедура (СОП)

Достигнутые результаты



ЭФФЕКТ



Систематизация работы с поставщиками
(оптимизация временных затрат)



Оптимизация затрат на закупку игрового
оборудования в ДОУ



Предупреждение и устранение потерь
ожидания



Удовлетворенность участников
образовательных отношений
